

**Chantier :** Ecole Maternelle Sainte Marguerite  
10 boulevard pages  
13009 Marseille

**Client :** Ville de Marseille

## ROV Développement

### INSPECTION VIDEO

Chantier :  
**Ecole Maternelle Sainte Marguerite**

Réseaux :  
**Eaux Usées**

Début des travaux : 26/10/2018  
Fin des travaux : 26/10/2018

Rédaction :

Date : 26/10/2018  
Visa :

Vérification :

Date : 26/10/2018  
Visa :

Validation :

Date : 26/10/2018  
Visa :

Tronçons inspectés : **13**Branchements inspect. : **0**Regards : **15**Longueur totale : **101.10 ml** / inspectée : **100.60 ml****SOMMAIRE**

RV1 vers RV2	3
RV2 vers RV3	5
RV4 vers RV3	7
EP1 vers EP2	9
EP2 vers EP3	11
RV5 vers RV4	13
RE1 vers RV3	15
EP3 vers EP4	17
EP6 vers EP5	19
EP7 vers EP5	21
EP5 vers EP4	23
EP4 vers SIPHON	25
RV3 vers SIPHON	28

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>6.80 ml</b>	Section : (ACB) <b>140 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV1 vers RV2</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>6.80 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV2 vers RV1 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON RV2 vers RV1**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
RV2	↓ RV2		
	↓ 3.60ml / RV2	2	RAS à 3.6m
	↓ 6.80ml / RV2	1	Arrivé dans le regard RV1 à 6.8m
RV1	↓ RV1		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	<b>Inspection de RV1 vers RV2 :</b>  <b>RAS à 3.6m</b>  <b>Arrivé dans le regard RV1 à 6.8m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>RV1</b>	Profondeur : <b>0.45</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>RV2</b>	Profondeur : <b>0.65</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>6.80 ml</b>	Section : (ACB) <b>140 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV1 vers RV2</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>6.80 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV2 vers RV1 (B)</b>



PHOTO : <b>2</b>	DISTANCE : <b>3.60 m de RV2</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.6m</b>		

PHOTO : <b>1</b>	DISTANCE : <b>6.80 m de RV2</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard RV1 à 6.8m</b>		

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>6.00 ml</b>	Section : (ACB) <b>140 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV2 vers RV3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>6.00 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV2 vers RV3 (B)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON RV2 vers RV3**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
↓	RV2		
↓	3.00ml / RV2	4	RAS à 3m
↓	6.00ml / RV2	3	Arrivé dans le regard RV3 à 6m
↓	RV3		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	Inspection de RV2 vers RV3 :  <b>RAS à 3m</b>  <b>Arrivé dans le regard RV3 à 6m</b>
--	--

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>	

RV : <b>RV2</b>	Profondeur : <b>0.65</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>RV3</b>	Profondeur : <b>0.70</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>6.00 ml</b>		Section : (ACB) <b>140 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV2 vers RV3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>6.00 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV2 vers RV3 (A)</b>



PHOTO : <b>4</b>	DISTANCE : <b>3.00 m de RV2</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3m</b>		

PHOTO : <b>3</b>	DISTANCE : <b>6.00 m de RV2</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard RV3 à 6m</b>		

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.30 ml</b>	Section : (ACB) <b>140 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV4 vers RV3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.30 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV4 vers RV3 (B)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON RV4 vers RV3**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
RV4	↓ RV4		
	↓ 3.30ml / RV4	6	Présence de pierre avant notre hydrocurage à 3.3m
	↓ 7.30ml / RV4	5	Arrivé dans le regard RV3 à 7.3m
RV3	↓ RV3		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	<b>Inspection de RV4 vers RV3 :</b>  <b>Présence de pierre avant notre hydrocurage à 3.3m</b>  <b>Arrivé dans le regard RV3 à 7.3m</b>
--	--

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>RV4</b>	Profondeur : <b>0.50</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>RV3</b>	Profondeur : <b>0.70</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>8/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.30 ml</b>		Section : (ACB) <b>140 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.30 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV4 vers RV3 (A)</b>



PHOTO : <b>6</b>	DISTANCE : <b>3.30 m de RV4</b>	
OBSERVATIONS : <b>Présence de pierre avant notre hydrocurage à 3.3m</b>		

PHOTO : <b>5</b>	DISTANCE : <b>7.30 m de RV4</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard RV3 à 7.3m</b>		



Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.10 ml</b>	Section : (ACB) <b>125 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP1 vers EP2</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.10 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP2 vers EP1 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP2 vers EP1**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP2	↓ EP2		
	↓ 1.30ml / EP2	9	RAS à 1.3m
	↓ 4.50ml / EP2	8	RAS à 4.5m
	↓ 7.10ml / EP2	7	Arrivé dans le regard EP1 à 7.1m
EP1	↓ EP1		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	<b>Inspection de EP2 vers EP1 :</b>  <b>RAS à 1.3m</b>  <b>RAS à 4.5m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP1 à 7.1m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	


**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP1</b>	Profondeur : <b>0.30</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP2</b>	Profondeur : <b>0.35</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>

Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.10 ml</b>	Section : (ACB) <b>125 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP1 vers EP2</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.10 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP2 vers EP1 (B)</b>

PHOTO : <b>9</b>	DISTANCE : <b>1.30 m de EP2</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 1.3m</b>		

PHOTO : <b>8</b>	DISTANCE : <b>4.50 m de EP2</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 4.5m</b>		

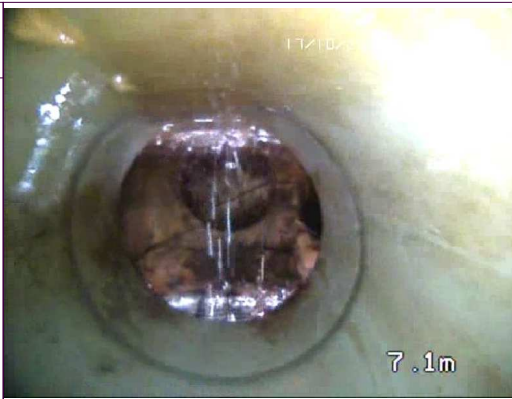PHOTO : <b>7</b>	DISTANCE : <b>7.10 m de EP2</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard EP1 à 7.1m</b>		

Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.60 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP2 vers EP3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.60 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP2 vers EP3 (B)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP2 vers EP3**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP2	↓ EP2		
	↓ 3.50ml / EP2	11	RAS à 3.5m
	↓ 7.60ml / EP2	10	Arrivé dans le regard EP3 à 7.6m
EP3	↓ EP3		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	<b>Inspection de EP2 vers EP3 :</b>  <b>RAS à 3.5m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP3 à 7.6m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP2</b>	Profondeur : <b>0.35</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP3</b>	Profondeur : <b>0.45</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>12/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>7.60 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.60 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP2 vers EP3 (A)</b>



PHOTO : <b>11</b>	DISTANCE : <b>3.50 m de EP2</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.5m</b>		

PHOTO : <b>10</b>	DISTANCE : <b>7.60 m de EP2</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard EP3 à 7.6m</b>		

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>4.20 ml</b>	Section : (ACB) <b>125 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV5 vers RV4</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>4.20 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV4 vers RV5 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON RV4 vers RV5**


Sens Insp	Distances	Photos	Observations
RV4	↓ RV4		
	↓ 3.10ml / RV4	12	Raccord PVC/Grès
	↓ 4.20ml / RV4	13	Arrivé dans le regard RV5 visible au sol dans les sanitaires enfants Prévoir de remaçonner le regard Présence de pierres
RV5	↓ RV5		


**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	<b>Inspection de RV4 vers RV5 :</b>  <b>Raccord PVC/Grès</b>  <b>Arrivé dans le regard RV5 visible au sol dans les sanitaires enfants</b> <b>Prévoir de remaçonner le regard</b> <b>Présence de pierres</b>
--	---

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Propriété bâtie (F)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>RV5</b>	Profondeur : Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>RV4</b>	Profondeur : <b>0.50</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>

	<b>Chantier : Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			<b>PAGE : 14/34</b> <b>RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p</b> <b>OPERATEUR : Jerome</b>
	<b>Type : (ACK)</b> <b>Eaux usées (A)</b>	<b>Longueur du tronçon :</b> <b>4.20 ml</b>		<b>Section : (ACB)</b> <b>125 mm</b>
<b>Date du chantier : (ABF)</b> <b>26/10/2018</b>	<b>Longueur inspectée :</b> <b>4.20 ml</b>		<b>Matériau : (ACD)</b> <b>PVC-U (AX)</b>	<b>Sens de l'inspection : (AAK)</b> <b>RV4 vers RV5 (B)</b>

<b>PHOTO : 12</b>	<b>DISTANCE : 3.10 m de RV4</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Raccord PVC/Grès</b>		

<b>PHOTO : 13</b>	<b>DISTANCE : 4.20 m de RV4</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Arrivé dans le regard RV5 visible au sol dans les sanitaires enfants</b> <b>Prévoir de remaçonner le regard</b> <b>Présence de pierres</b>		

Type : (ACK) <b>Unitaire ()</b>	Longueur du tronçon : <b>7.80 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RE1 vers RV3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.80 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV3 vers RE1 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON RV3 vers RE1**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
RV3	↓ RV3		
	↓ 3.70ml / RV3	16	RAS à 3.7m
	↓ 7.80ml / RV3	15	Marquage au sol du regard RE1 Profondeur 0.60m
	↓ 7.80ml / RV3	14	Arrivé dans le regard RE1 à 7.8m Marquage au sol Flèche bleue : vers le Pied de chute des WC du 1er étage Flèche Rouge : vers le regard RV6
RE1	↓ RE1		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	<b>Inspection de RV3 vers RE1 :</b>  <b>RAS à 3.7m</b>  <b>Arrivé dans le regard RE1 à 7.8m</b> <b>Marquage au sol</b> <b>Flèche bleue : vers le Pied de chute des WC du 1er étage</b> <b>Flèche Rouge : vers le regard RV6</b>  <b>Marquage au sol du regard RE1</b> <b>Profondeur 0.60m</b>
--	---


**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Propriété bâtie (F)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>RE1</b>	Profondeur : <b>0.60</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>RV3</b>	Profondeur : <b>0.70</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>

Type : (ACK) <b>Unitaire ()</b>	Longueur du tronçon : <b>7.80 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RE1 vers RV3</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>7.80 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>RV3 vers RE1 (B)</b>

PHOTO : <b>16</b>	DISTANCE : <b>3.70 m de RV3</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.7m</b>		

PHOTO : <b>15</b>	DISTANCE : <b>7.80 m de RV3</b>	
OBSERVATIONS : <b>Marquage au sol du regard RE1</b> <b>Profondeur 0.60m</b>		

PHOTO : <b>14</b>	DISTANCE : <b>7.80 m de RV3</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard RE1 à 7.8m</b> <b>Marquage au sol</b> <b>Flèche bleue : vers le Pied de chute des WC du 1er étage</b> <b>Flèche Rouge : vers le regard RV6</b>		



Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>4.60 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP3 vers EP4</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>4.60 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP3 vers EP4 (B)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP3 vers EP4**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP3	↓ EP3		
	↓ 2.30ml / EP3	18	RAS à 2.3m
	↓ 4.60ml / EP3	17	Arrivé dans le regard EP4 à 4.6m
EP4	↓ EP4		


**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	Inspection de EP3 vers EP4 :  <b>RAS à 2.3m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP4 à 4.6m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	


**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>	

RV : <b>EP3</b>	Profondeur : <b>0.45</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP4</b>	Profondeur : <b>0.52</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>

		<b>Chantier : Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>		<b>PAGE : 18/34</b> <b>RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p</b> <b>OPERATEUR : Jerome</b>
<b>Type : (ACK)</b> <b>Pluvial (B)</b>	<b>Longueur du tronçon :</b> <b>4.60 ml</b>		<b>Section : (ACB)</b> <b>200 mm</b>	<b>Sens de l'écoulement :</b> <b>EP3 vers EP4</b>
<b>Date du chantier : (ABF)</b> <b>26/10/2018</b>	<b>Longueur inspectée :</b> <b>4.60 ml</b>		<b>Matériau : (ACD)</b> <b>PVC-U (AX)</b>	<b>Sens de l'inspection : (AAK)</b> <b>EP3 vers EP4 (A)</b>

<b>PHOTO : 18</b>	<b>DISTANCE :2.30 m de EP3</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>RAS à 2.3m</b>		
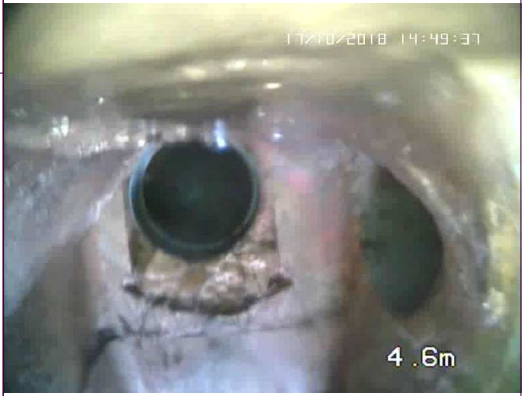
<b>PHOTO : 17</b>	<b>DISTANCE :4.60 m de EP3</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Arrivé dans le regard EP4 à 4.6m</b>		

Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>5.70 ml</b>	Section : (ACB) <b>100 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP6 vers EP5</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>5.70 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP6 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP5 vers EP6**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP5	↓ EP5		
	↓ 3.30ml / EP5	20	RAS à 3.3m
	↓ 5.70ml / EP5	19	Arrivé dans le regard EP6 à 5.7m
EP6	↓ EP6		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	Inspection de EP5 vers EP6 :  <b>RAS à 3.3m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP6 à 5.7m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP6</b>	Profondeur : <b>0.30</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP5</b>	Profondeur : <b>0.5</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>20/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>5.70 ml</b>		Section : (ACB) <b>100 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>5.70 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP6 (B)</b>

PHOTO : <b>20</b>	DISTANCE : <b>3.30 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.3m</b>		

PHOTO : <b>19</b>	DISTANCE : <b>5.70 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard EP6 à 5.7m</b>		

Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>13.00 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP7 vers EP5</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>13.00 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP7 (A)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP5 vers EP7**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP5	↓ EP5		
	↓ 3.50ml / EP5	21	RAS à 3.5m
	↓ 8.80ml / EP5	23	RAS à 8.8m
	↓ 13.00ml / EP5	22	Arrivé dans le regard EP7 à 13m
EP7	↓ EP7		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b>	<b>Inspection à partir de EP5 vers EP7 :</b>  <b>RAS à 3.5m</b>  <b>RAS à 8.8m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP7 à 13m</b>
Etat général du collecteur : <b>Bon</b>	
Etat général des joints : <b>Bon</b>	

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP7</b>	Profondeur : <b>0.25</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP5</b>	Profondeur : <b>0.5</b>	Echelons :	Dimension regard :
	Cunette refermée : <b>Non</b>	Branchements : <b>0</b>	Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>22/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>13.00 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>13.00 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP7 (B)</b>


PHOTO : <b>21</b>	DISTANCE : <b>3.50 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.5m</b>		

PHOTO : <b>23</b>	DISTANCE : <b>8.80 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 8.8m</b>		

PHOTO : <b>22</b>	DISTANCE : <b>13.00 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard EP7 à 13m</b>		

Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>2.20 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP5 vers EP4</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>2.20 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP4 (B)</b>

**SYNTHESE DU TRONCON EP5 vers EP4**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
EP5	↓ EP5		
	↓ 1.10ml / EP5	25	RAS à 1.1m
	↓ 2.20ml / EP5	24	Arrivé dans le regard EP4 à 2.2m
EP4	↓ EP4		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	Inspection de EP5 vers EP4 :  <b>RAS à 1.1m</b>  <b>Arrivé dans le regard EP4 à 2.2m</b>
--	--

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP5</b>	Profondeur : <b>0.5</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>EP4</b>	Profondeur : <b>0.52</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>24/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>2.20 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>2.20 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	Sens de l'inspection : (AAK) <b>EP5 vers EP4 (A)</b>



PHOTO : <b>25</b>	DISTANCE : <b>1.10 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 1.1m</b>		

PHOTO : <b>24</b>	DISTANCE : <b>2.20 m de EP5</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard EP4 à 2.2m</b>		



Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>10.80 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>EP4 vers SIPHON</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>10.60 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	

**SYNTHESE DU TRONCON EP4 vers SIPHON**


Sens Insp	Distances	Photos	Observations
SIPHON	↓ SIPHON		
	↓ 4.80ml / SIPHON	31	RAS à 4.8m
	↓ 7.90ml / SIPHON	30	Branchement à 9h00 à 7.9m Arrivé de la verticale pluviale
	↓ 9.20ml / SIPHON	28	Coude à 9.2m
	↓ 9.70ml / SIPHON	29	Caméra bloquée et noyée Marquage au sol
	↑ 0.90ml / EP4	27	Caméra noyée et bloquée à 0.90m Point dur Marquage au sol
	↑ 0.70ml / EP4	32	Marquage au sol du point dur Profondeur 0.80m
	↑ 0.40ml / EP4	26	Coude à 0.4m Présence d'eau stagnante
EP4	↑ EP4		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	<b>Inspection de EP4 vers le SIPHON :</b>  <b>Coude à 0.4m</b> <b>Présence d'eau stagnante</b>  <b>Marquage au sol du point dur</b> <b>Profondeur 0.80m</b>  <b>Caméra noyée et bloquée à 0.9m</b> <b>Point dur</b> <b>Marquage au sol</b> <b>Inspection du SIPHON vers EP4 :</b>  <b>RAS à 4.8m</b>  <b>Branchement à 9h00 à 7.9m</b> <b>Arrivé de la verticale pluviale</b>  <b>Coude à 9.2m</b>  <b>Caméra bloquée et noyée</b> <b>Marquage au sol</b>
--	--


**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
RV : <b>EP4</b>	Profondeur : <b>0.52</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
RV : <b>SIPHON</b>	Profondeur : <b>1.20</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>

	<b>Chantier : Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			<b>PAGE : 26/34</b> <b>RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p</b> <b>OPERATEUR : Jerome</b>
	<b>Type : (ACK)</b> <b>Pluvial (B)</b>	<b>Longueur du tronçon :</b> <b>10.80 ml</b>		<b>Section : (ACB)</b> <b>200 mm</b>
<b>Date du chantier : (ABF)</b> <b>26/10/2018</b>	<b>Longueur inspectée :</b> <b>10.60 ml</b>		<b>Matériau : (ACD)</b> <b>PVC-U (AX)</b>	

<b>PHOTO : 26</b>	<b>DISTANCE :0.40 m de EP4</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Coude à 0.4m</b> <b>Présence d'eau stagnante</b>		

<b>PHOTO : 32</b>	<b>DISTANCE :0.70 m de EP4</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Marquage au sol du point dur</b> <b>Profondeur 0.80m</b>		

<b>PHOTO : 27</b>	<b>DISTANCE :0.90 m de EP4</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Caméra noyée et bloquée à 0.90m</b> <b>Point dur</b> <b>Marquage au sol</b>		

<b>PHOTO : 29</b>	<b>DISTANCE :9.70 m de SIPHON</b>	
<b>OBSERVATIONS :</b> <b>Caméra bloquée et noyée</b> <b>Marquage au sol</b>		


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>27/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Pluvial (B)</b>	Longueur du tronçon : <b>10.80 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>10.60 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	

PHOTO : <b>28</b>	DISTANCE : <b>9.20 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>Coude à 9.2m</b>		

PHOTO : <b>30</b>	DISTANCE : <b>7.90 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>Branchement à 9h00 à 7.9m</b> <b>Arrivé de la verticale pluviale</b>		

PHOTO : <b>31</b>	DISTANCE : <b>4.80 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 4.8m</b>		

Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>18.00 ml</b>	Section : (ACB) <b>200 mm</b>	Sens de l'écoulement : <b>RV3 vers SIPHON</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>17.70 ml</b>	Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	

**SYNTHESE DU TRONCON RV3 vers SIPHON**

Sens Insp	Distances	Photos	Observations
SIPHON	↓ SIPHON		
	↓ 4.70ml / SIPHON	37	RAS à 4.7m
	↓ 10.80ml / SIPHON	36	Marquage au sol du regard enterré RE2 Profondeur 0.75m
	↓ 10.80ml / SIPHON	35	Arrivé dans le regard RE2 à 10.8m Présence de racines Marquage au sol
	↑ 6.90ml / RV3		
	↑ 6.90ml / RV3	33	Arrivé dans le regard enterré RE2 à 6.9m
	↑ 3.10ml / RV3	34	RAS à 3.1m
RV3	↑ RV3		

**OBSERVATIONS GENERALES DU TRONCON**

Etat général de propreté : <b>Bon</b> Etat général du collecteur : <b>Bon</b> Etat général des joints : <b>Bon</b>	<b>Inspection de RV3 vers le SIPHON :</b>  <b>RAS à 3.1m</b>  <b>Arrivé dans le regard enterré RE2 à 6.9m</b> <b>Inspection du SIPHON vers RV3 :</b>  <b>RAS à 4.7m</b>  <b>Arrivé dans le regard RE2 à 10.8m</b> <b>Présence de racines</b> <b>Marquage au sol</b>  <b>Marquage au sol du regard enterré RE2</b> <b>Profondeur 0.75m</b>
--	---

**CONDITIONS GENERALES DE L'INSPECTION**

Curage(ACM) : <b>OUI (A)</b>	Surface(AAL) : <b>Zone piétons (D)</b>	(ABE) : <b>Inspection par télécaméra (B)</b>	
Obturation(ADC) : <b>NON (A)</b>	Type(ACJ) : <b>Gravitaire (A)</b>		
<b>RV : RV3</b>	Profondeur : <b>0.70</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>
<b>RV : SIPHON</b>	Profondeur : <b>1.20</b> Cunette refermée : <b>Non</b>	Echelons : Branchements : <b>0</b>	Dimension regard : Infiltration regard : <b>Non</b>


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>29/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>18.00 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>17.70 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	

PHOTO : <b>34</b>	DISTANCE : <b>3.10 m de RV3</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 3.1m</b>		

PHOTO : <b>33</b>	DISTANCE : <b>6.90 m de RV3</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard enterré RE2 à 6.9m</b>		

PHOTO : <b>35</b>	DISTANCE : <b>10.80 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>Arrivé dans le regard RE2 à 10.8m</b> <b>Présence de racines</b> <b>Marquage au sol</b>		

PHOTO : <b>36</b>	DISTANCE : <b>10.80 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>Marquage au sol du regard enterré RE2</b> <b>Profondeur 0.75m</b>		


	Chantier : <b>Ecole Maternelle Sainte Marguerite</b> <b>10 boulevard pages</b>			PAGE : <b>30/34</b> RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p OPERATEUR : <b>Jerome</b>
	Type : (ACK) <b>Eaux usées (A)</b>	Longueur du tronçon : <b>18.00 ml</b>		Section : (ACB) <b>200 mm</b>
Date du chantier : (ABF) <b>26/10/2018</b>	Longueur inspectée : <b>17.70 ml</b>		Matériau : (ACD) <b>PVC-U (AX)</b>	

PHOTO : <b>37</b>	DISTANCE : <b>4.70 m de SIPHON</b>	
OBSERVATIONS : <b>RAS à 4.7m</b>		



Chantier : Ecole Maternelle Sainte Marguerite

RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p

Adresse : 10 boulevard pages

Date : 26/10/2018

Réseau : Eaux Usées

Tronçon	Profondeurs (m)	Section (mm)	Longueur (ml)	Matériaux	Longueur Tuyau (m)	Dist/Regard (ml)	Commentaires / codes (NFEN13508-2)					Page
							Code	Caractérisations	Quantifications	Emplacement	Assemb	
RV2 vers RV1	0.45 - 0.65	140	6.80	PVC-U								3
						6.80 /RV2	Arrivé dans le regard RV1 à 6.8m					4
						3.60 /RV2	RAS à 3.6m					4
RV2 vers RV3	0.65 - 0.70	140	6.00	PVC-U								5
						3.00 /RV2	RAS à 3m					6
						6.00 /RV2	Arrivé dans le regard RV3 à 6m					6
RV4 vers RV3	0.50 - 0.70	140	7.30	PVC-U								7
						3.30 /RV4	Présence de pierre avant notre hydrocurage à 3.3m					8
						7.30 /RV4	Arrivé dans le regard RV3 à 7.3m					8
EP2 vers EP1	0.30 - 0.35	125	7.10	PVC-U								9
						7.10 /EP2	Arrivé dans le regard EP1 à 7.1m					10
						4.50 /EP2	RAS à 4.5m					10
						1.30 /EP2	RAS à 1.3m					10
EP2 vers EP3	0.35 - 0.45	200	7.60	PVC-U								11
						3.50 /EP2	RAS à 3.5m					12
						7.60 /EP2	Arrivé dans le regard EP3 à 7.6m					12
RV4 vers RV5	0.50	125	4.20	PVC-U								13
						4.20 /RV4	Arrivé dans le regard RV5 visible au sol dans les sanitaires enfants Prévoir de remaçonner le regard Présence de pierres					14
						3.10 /RV4	Raccord PVC/Grès					14
RV3 vers RE1	0.60 - 0.70	200	7.80	PVC-U								15
						7.80 /RV3	Arrivé dans le regard RE1 à 7.8m Marquage au sol Flèche bleue : vers le Pied de chute des WC du 1er étage Flèche Rouge : vers le regard RV6					16
						7.80 /RV3	Marquage au sol du regard RE1 Profondeur 0.60m					16
						3.70 /RV3	RAS à 3.7m					16
EP3 vers EP4	0.45 - 0.52	200	4.60	PVC-U								17
						2.30 /EP3	RAS à 2.3m					18
						4.60 /EP3	Arrivé dans le regard EP4 à 4.6m					18
EP5 vers EP6	0.30 - 0.5	100	5.70	PVC-U								19



Chantier : Ecole Maternelle Sainte Marguerite

RAPPORT : 2018-10-17 10 boulevard p

Adresse : 10 boulevard pages

Date : 26/10/2018

Réseau : Eaux Usées

Tronçon	Profondeurs (m)	Section (mm)	Longueur (ml)	Matériaux	Longueur Tuyau (m)	Dist/Regard (ml)	Commentaires / codes (NFEN13508-2)					Page
							Code	Caractérisations	Quantifications	Emplacement	Assemb	
EP5 vers EP7	0.25 - 0.5	200	13.00	PVC-U		5.70 /EP5	Arrivé dans le regard EP6 à 5.7m					20
						3.30 /EP5	RAS à 3.3m					20
												21
EP5 vers EP4	0.5 - 0.52	200	2.20	PVC-U		13.00 /EP5	Arrivé dans le regard EP7 à 13m					22
						8.80 /EP5	RAS à 8.8m					22
						3.50 /EP5	RAS à 3.5m					22
												23
EP4 vers SIPHON	0.52 - 1.20	200	10.80	PVC-U		1.10 /EP5	RAS à 1.1m					24
						2.20 /EP5	Arrivé dans le regard EP4 à 2.2m					24
												25
RV3 vers SIPHON	0.70 - 1.20	200	18.00	PVC-U		0.40 /EP4	Coude à 0.4m					26
						0.70 /EP4	Présence d'eau stagnante					26
						0.90 /EP4	Marquage au sol du point dur					26
						0.90 /EP4	Profondeur 0.80m					26
						0.90 /EP4	Caméra noyée et bloquée à 0.90m					26
						0.90 /EP4	Point dur					26
						0.90 /EP4	Marquage au sol					26
RV3 vers SIPHON	0.70 - 1.20	200	18.00	PVC-U		9.70 /SIPHON	Caméra bloquée et noyée					26
						9.70 /SIPHON	Marquage au sol					26
						9.20 /SIPHON	Coude à 9.2m					27
						7.90 /SIPHON	Branchement à 9h00 à 7.9m					27
						7.90 /SIPHON	Arrivé de la verticale pluviale					27
						4.80 /SIPHON	RAS à 4.8m					27
												28
RV3 vers SIPHON	0.70 - 1.20	200	18.00	PVC-U		3.10 /RV3	RAS à 3.1m					29
						6.90 /RV3	Arrivé dans le regard enterré RE2 à 6.9m					29
						10.80 /SIPHON	Arrivé dans le regard RE2 à 10.8m					29
						10.80 /SIPHON	Présence de racines					29
						10.80 /SIPHON	Marquage au sol					29
						10.80 /SIPHON	Marquage au sol du regard enterré RE2					29
							Profondeur 0.75m					29
						4.70 /SIPHON	RAS à 4.7m					30



Tronçons inspectés : **13**

Branchements inspect. : **0**

Regards : **15**

Longueur totale : **101.10 ml** / inspectée : **100.60 ml**

### OBSERVATION GENERALE

**Prévoir de remaçonner le regard RV5 dans les sanitaires enfants**

**Présence de pierres dans le regard.**

**Présence de deux regards enterrés RE1 et RE2.**

**Prévoir de les mettre à jour.**

**Voir plan et marquages au sol.**

**Profondeurs respectives 0.80m et 0.75m**

**Point dur sur le tronçon EP4 --> SIPHON**

**Marquage au sol de l'anomalie**

**Profondeur 0.80m**

**RAS sur le reste du réseau inspecté.**


Tronçons inspectés : **13**


Branchements inspectés : **0**

Regards : **15**

Longueur totale : **101.10 ml** / inspectée : **100.60 ml**

**DIAGRAMME DU RESEAU**

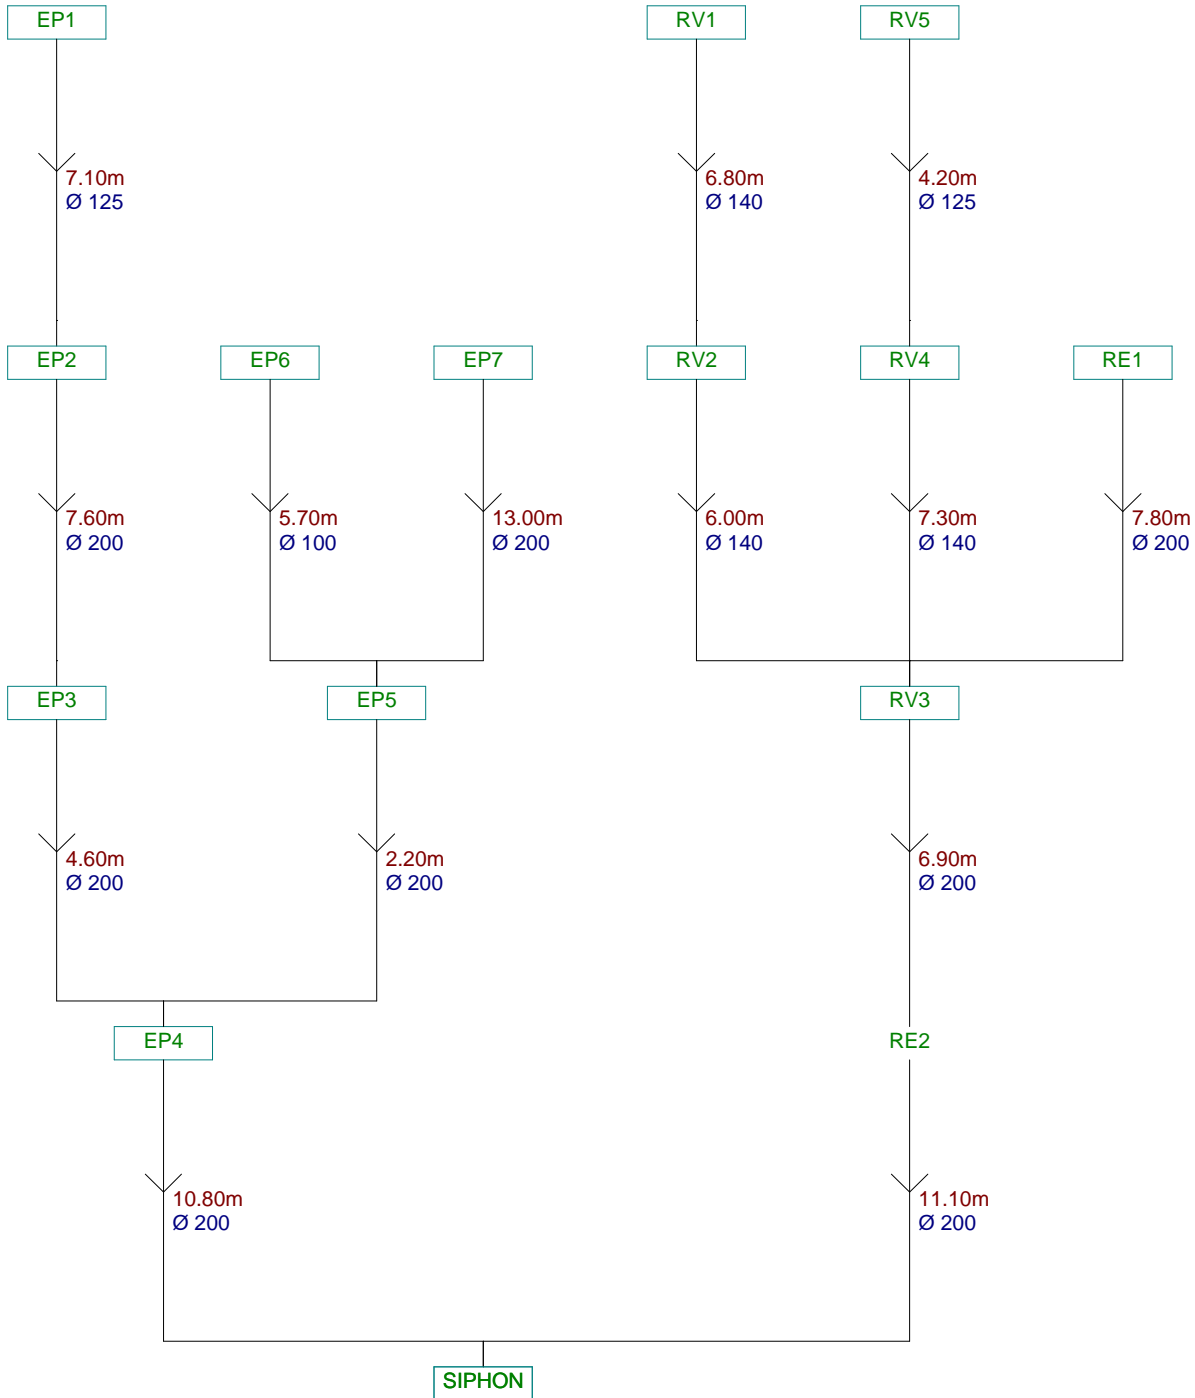

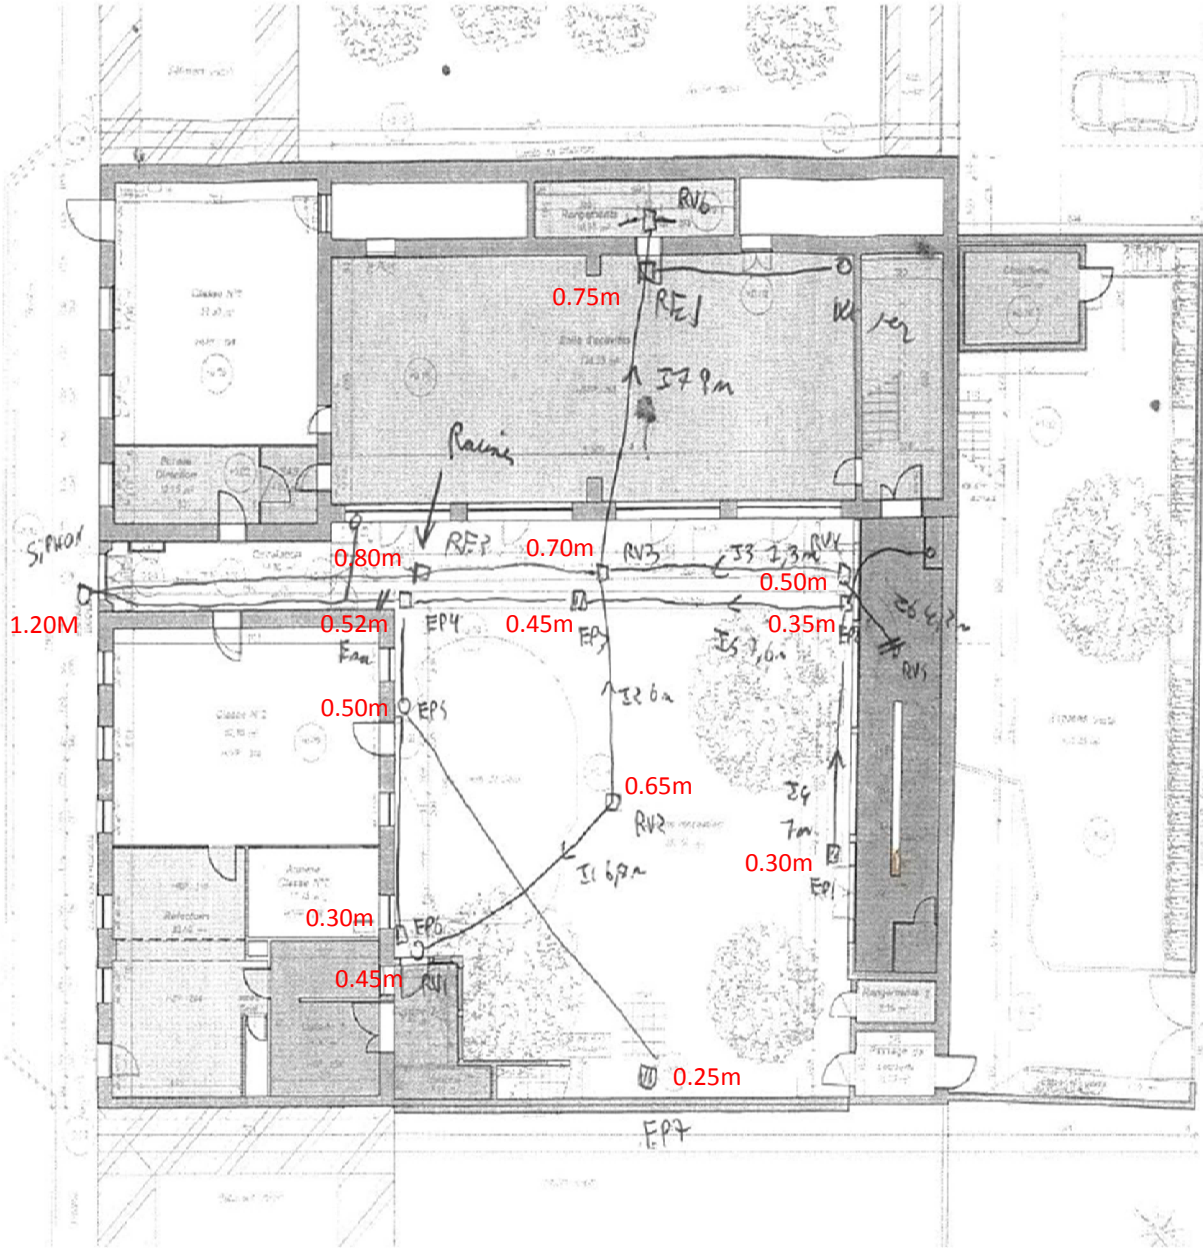

Légende des espaces

- bureau
- circulation
- classe
- cuisine
- logement
- rangement
- réfectoire
- salle polyvalente
- sanitaires
- technique
