



58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE

Tél. : 04 42 04 99 81
Fax : 04 42 04 99 27
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

**RAPPORT DE REPERAGE 20150400295_EM SAINTE MARGUERITE-VDM-1 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 18/05/2015**

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	Ecole Maternelle Sainte Marguerite - 10, Boulevard Pagès 13009 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Aménagement des locaux existants et sanitaires à démolir
Date de visite :	27/04/2015

GARREAU Yvane

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	3
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	12
4.	Résultats détaillés du repérage	14
5.	Attestation sur l'honneur.....	16
6.	Attestation d'assurance.....	17
7.	Certificat de compétences	Erreur ! Signet non défini.
8.	Annexes.....	21

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Bâtiment scolaire
Numéro (indice) : 20150400295_EM Sainte Marguerite-VdM (1)
Date du permis de construire (à défaut date de construction) : Non communiqué
Adresse complète : Ecole Maternelle Sainte Marguerite
10, Boulevard Pagès
13009 MARSEILLE
Référence cadastrale : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété
Fonction principale du bâtiment : Etablissement d'enseignement : école maternelle

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : Ville de Marseille
Adresse : DIRCA / Service Territorial des Bâtiments Est
13009 MARSEILLE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : GARREAU Yvane
Email : alcyon_marseille@yahoo.fr
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I Cert . Le N° du certificat est N° CPDI 3190 délivré le 24/10/2014 et expirant le 23/10/2019.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
Adresse : 58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE
Numéro SIRET : 419 035 381 00039
Code NAF : 7112B
N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : LLOYD'S
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2016

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arteparc
Bâtiment E - Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Le diagnostic est limité aux éléments impactés par les travaux, désignés par le donneur d'ordre le jour de notre visite: Démolition des toitures des bâtiments en rez-de-chaussée afin de les élever d'un étage et de créer des classes supplémentaires. Des travaux d'aménagement des locaux existants sont également prévus.

- **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Plans de l'école initial (APS) et projet de réaménagement (ESQ), Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition rédigé par Arcalia le 02/10/2013, relatif aux sanitaires en rez-de-chaussée.

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Remarques particulières :

Le diagnostic est limité aux éléments impactés par les travaux, désignés par le donneur d'ordre le jour de notre visite: Démolition des toitures des bâtiments en rez-de-chaussée afin de les élever d'un étage et de créer des classes supplémentaires. Des travaux d'aménagement des locaux existants sont également prévus.

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Plaque ondulée/Plaque en fibres-ciment	Toiture côté conciergerie	n° 60995	Dégradations locales
Revêtement de sol/Dalle plastique	Sanitaires (1er Étage)	n° 60997	Dégradations locales
Revêtement de sol/Colle bitumineuse	Sanitaires (1er Étage)	n° 60998	Dégradations locales

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Revêtement de sol/Colle de carrelage [Hors annexe 13-9]	Classe n°2 (RDC)	n° 60984
Revêtement de sol/Colle de plinthes [Hors annexe 13-9]	Classe n°2 (RDC)	n° 60985
Mur/Enduit projeté	Classe n°2 (RDC)	n° 60986
Faux plafond/Plaque	Classe n°2 (RDC)	n° 60987
Mur/Enduit projeté (+ toile de verre)	Annexe classe n°2 (RDC)	n° 61012
Revêtement de mur/Colle de faïence [Hors annexe 13-9]	Annexe classe n°2 (RDC)	n° 61013
Revêtement de sol/Colle de carrelage [Hors annexe 13-9]	Réfectoire (RDC)	n° 60988
Mur/Enduit projeté	Réfectoire (RDC)	n° 60990
Revêtement de sol/Colle de plinthes [Hors annexe 13-9]	Réfectoire (RDC)	n° 60989
Revêtement de mur/Enduit mural [Hors annexe 13-9]	Réfectoire (RDC)	n° 60993
Revêtement de sol/Colle de carrelage [Hors annexe 13-9]	Conciergerie (terrasse) (RDC)	n° 61006
Revêtement de mur/Crépi [Hors annexe 13-9]	Conciergerie (terrasse) (RDC)	n° 61007
Revêtement de mur/Enduit mural [Hors annexe 13-9]	Conciergerie (terrasse) (RDC)	n° 61008
Revêtement de sol/Matériau compact [Hors annexe 13-9]	Escalier accès appart de fonction conciergerie (RDC)	n° 60991
Revêtement de mur/Crépi [Hors annexe 13-9]	Escalier accès appart de fonction conciergerie (RDC)	n° 60992
Revêtement de mur/Crépi [Hors annexe 13-9]	Salle d'activités (RDC)	n° 60994
Couverture ondulée toiture/Plaques sous tuiles [Hors annexe 13-9]	Salle d'activités (RDC)	n° 60996
Mur/Enduit projeté	Salle d'activités (RDC)	n° 61004
Faux plafond/Plaque	Salle d'activités (RDC)	n° 61005
Revêtement de sol/Lés plastique avec sous-couche	Salle d'activités (RDC)	n° 61003
Revêtement de mur/Crépi [Hors annexe 13-9]	Classe n°1 (RDC)	n° 61009
Revêtement de sol/Chape maigre	Sanitaires (1er Étage)	n° 60999
Mur/Enduit projeté	Sanitaires (1er Étage)	n° 61000
Faux plafond/Plaque	Sanitaires (1er Étage)	n° 61001
Revêtement de sol/Chape maigre	Sanitaires (1er Étage)	n° 61010
Revêtement de mur/Colle de faïence [Hors annexe 13-9]	Sanitaires (1er Étage)	n° 61011
Mur/Enduit projeté	Classe n°3 (1er Étage)	n° 61002

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées


Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes la localisation des prélèvements

Toiture côté conciergerie

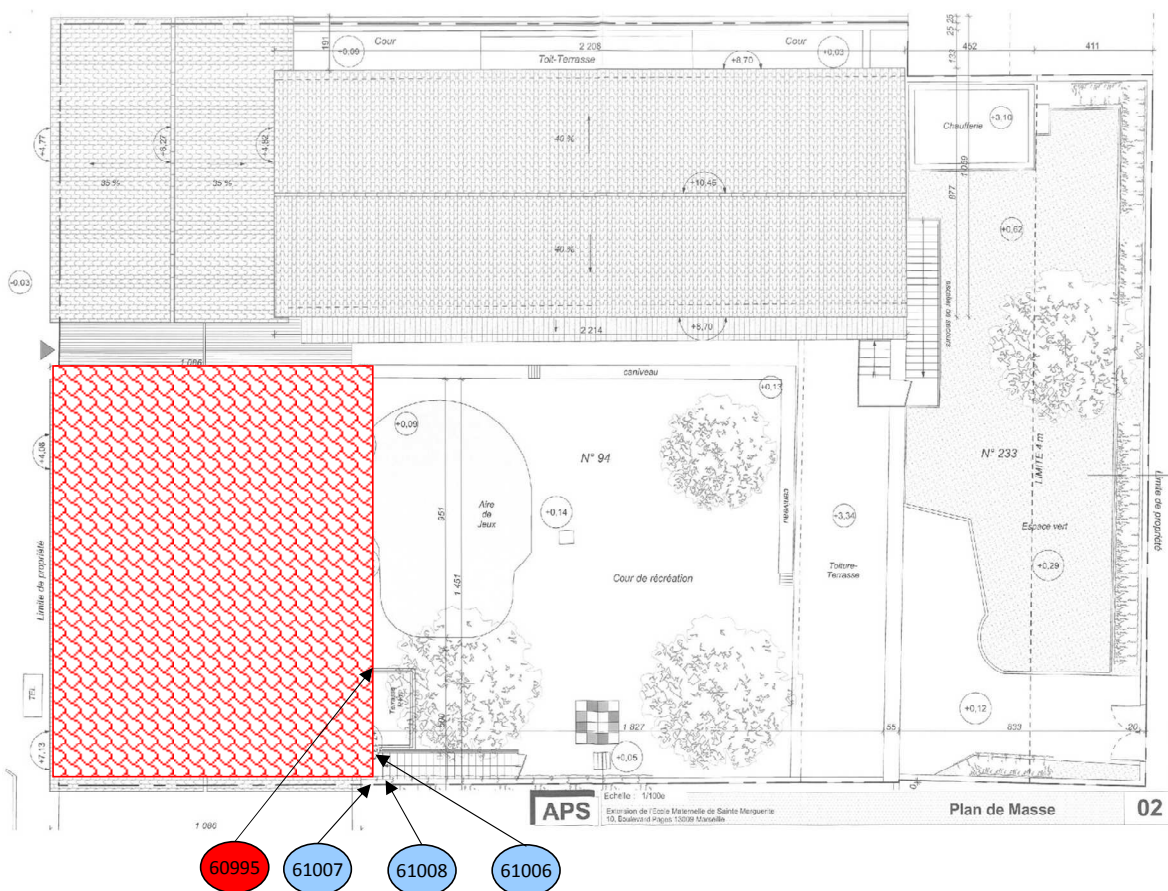

Légende:



Echantillon : absence d'amiante



Echantillon : présence d'amiante




Plaque sous tuile avec présence d'amiante


- Echantillons avec présence d'amiante: n° 60995 (plaques sous tuiles)
- Localisation: toiture côté conciergerie, au-dessus des classes 2 et réfectoire

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Rez-de-chaussée

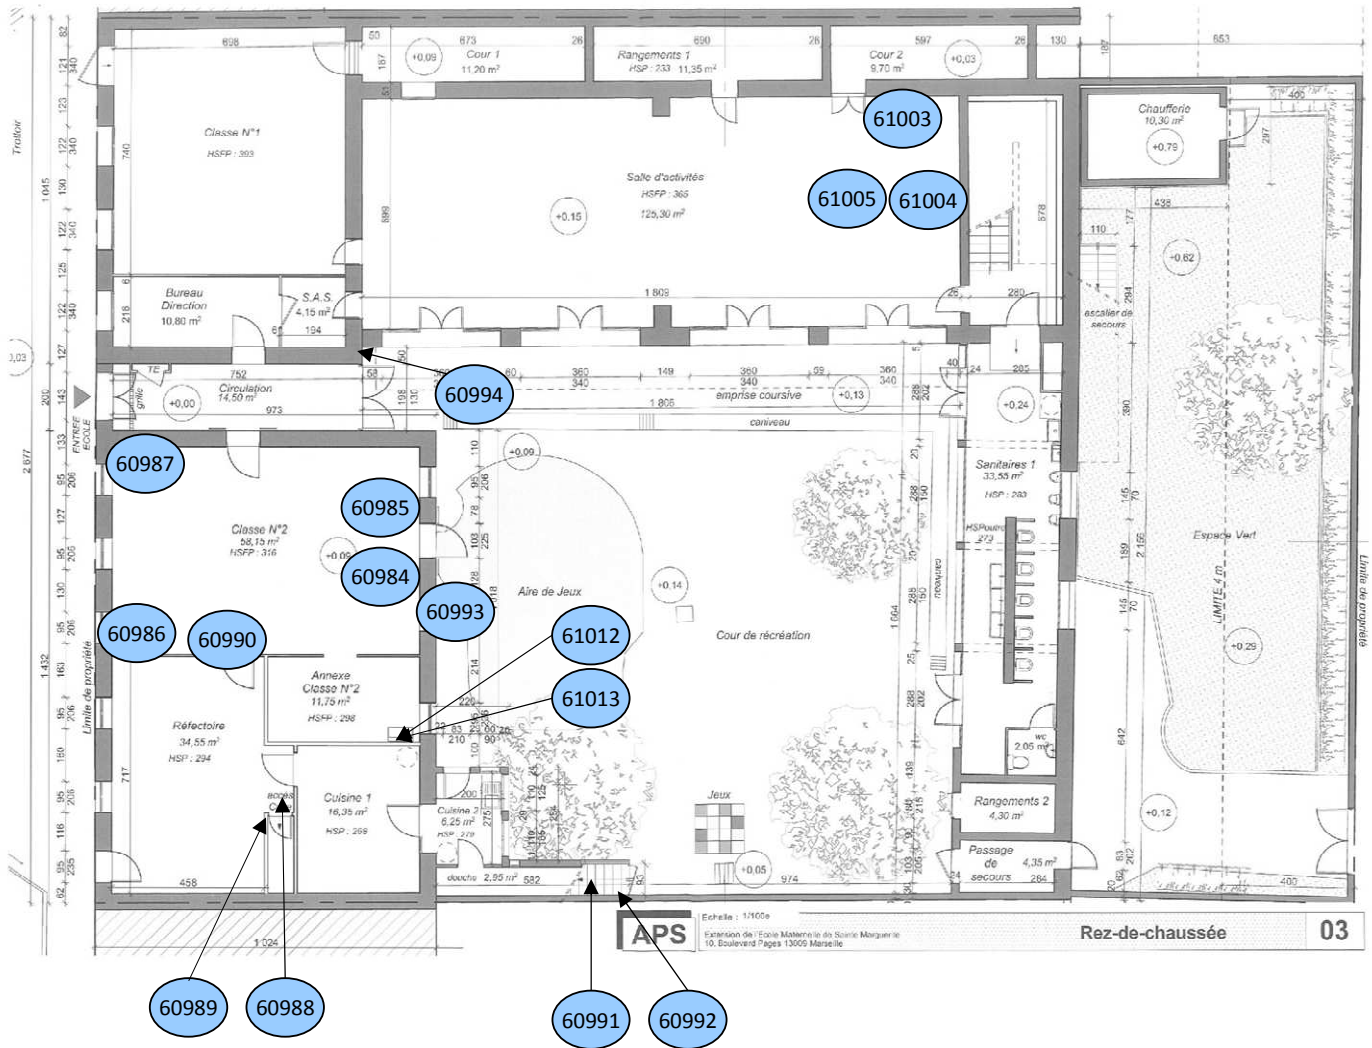


Légende:

 Echantillon : absence d'amiante



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

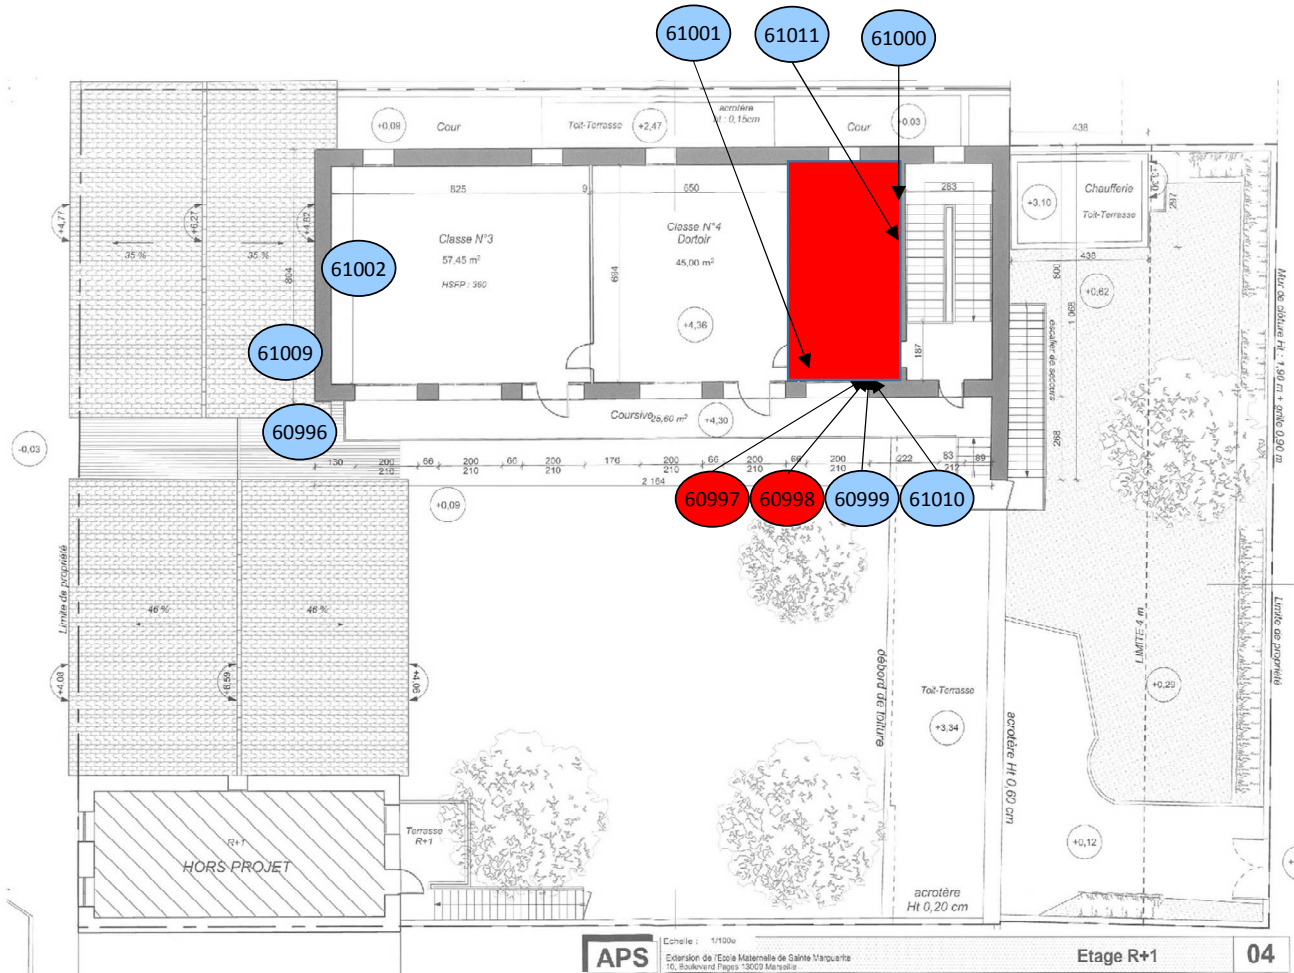Etage R+1



- Echantillons avec présence d'amiante: n° 60997 (dalle de sol blanche) et n° 60998 (colle noire)
- Localisation: Sanitaires R+1

Légende:

-  Echantillon : absence d'amiante
-  Echantillon : présence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage	27/04/2015
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage	Plans de l'école initial (APS) et projet de réaménagement (ESQ), Pré-rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition rédigé par Arcalia le 02/10/2013, relatif aux sanitaires en rez-de-chaussée.
Représentant du propriétaire (accompagnateur)	Ville de Marseille (M. PALUMBO)

3.3 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom
Classe n°2
Annexe classe n°2
Réfectoire
Conciergerie (terrasse)
Escalier accès appart de fonction conciergerie
Salle d'activités
Classe n°1
Sanitaires
Classe n°3

3.4 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.5 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage


Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/ absence d'amiante	Etat
Classe n°2 (RDC)	Revêtement de sol	Colle de carrelage		-	Oui : 60984	Absence d'amiante	
Classe n°2 (RDC)	Revêtement de sol	Colle de plinthes		-	Oui : 60985	Absence d'amiante	
Classe n°2 (RDC)	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 60986	Absence d'amiante	
Classe n°2 (RDC)	Faux plafond	Plaque		-	Oui : 60987	Absence d'amiante	
Annexe classe n°2 (RDC)	Mur	Enduit projeté	+ toile de verre	-	Oui : 61012	Absence d'amiante	
Annexe classe n°2 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de faïence		-	Oui : 61013	Absence d'amiante	
Réfectoire (RDC)	Revêtement de sol	Colle de carrelage		-	Oui : 60988	Absence d'amiante	
Réfectoire (RDC)	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 60990	Absence d'amiante	
Réfectoire (RDC)	Revêtement de sol	Colle de plinthes		-	Oui : 60989	Absence d'amiante	
Réfectoire (RDC)	Revêtement de mur	Enduit mural		-	Oui : 60993	Absence d'amiante	
Conciergerie (terrasse) (RDC)	Revêtement de sol	Colle de carrelage		-	Oui : 61006	Absence d'amiante	
Conciergerie (terrasse) (RDC)	Revêtement de mur	Crépi		-	Oui : 61007	Absence d'amiante	
Conciergerie (terrasse) (RDC)	Revêtement de mur	Enduit mural		-	Oui : 61008	Absence d'amiante	
Escalier accès appart de fonction conciergerie (RDC)	Revêtement de sol	Matériau compact		-	Oui : 60991	Absence d'amiante	
Escalier accès appart de fonction conciergerie (RDC)	Revêtement de mur	Crépi		-	Oui : 60992	Absence d'amiante	
Salle d'activités (RDC)	Revêtement de mur	Crépi		-	Oui : 60994	Absence d'amiante	
Salle d'activités (RDC)	Couverture ondulée toiture	Plaques sous tuiles		-	Oui : 60996	Absence d'amiante	
Salle d'activités (RDC)	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 61004	Absence d'amiante	
Salle d'activités (RDC)	Faux plafond	Plaque		-	Oui : 61005	Absence d'amiante	
Salle d'activités (RDC)	Revêtement de sol	Lés plastique avec sous-couche		-	Oui : 61003	Absence d'amiante	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/ absence d'amiante	Etat
Classe n°1 (RDC)	Revêtement de mur	Crépi		-	Oui : 61009	Absence d'amiante	
Sanitaires (1er Étage)	Revêtement de sol	Chape maigre		-	Oui : 60999	Absence d'amiante	
Sanitaires (1er Étage)	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 61000	Absence d'amiante	
Sanitaires (1er Étage)	Faux plafond	Plaque		-	Oui : 61001	Absence d'amiante	
Sanitaires (1er Étage)	Revêtement de sol	Chape maigre		-	Oui : 61010	Absence d'amiante	
Sanitaires (1er Étage)	Revêtement de mur	Colle de faïence		-	Oui : 61011	Absence d'amiante	
Classe n°3 (1er Étage)	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 61002	Absence d'amiante	
Plaques sous tuiles (toiture côté conciergerie)	Plaque ondulée	Plaque en fibres-ciment		-	Oui : 60995	Présence d'amiante	Dégradations locales
Sanitaires (1er Étage)	Revêtement de sol	Dalle plastique		-	Oui : 60997	Présence d'amiante	Dégradations locales
Sanitaires (1er Étage)	Revêtement de sol	Colle bitumineuse		-	Oui : 60998	Présence d'amiante	Dégradations locales

Observations : Le diagnostic est limité aux éléments impactés par les travaux, désignés par le donneur d'ordre le jour de notre visite: Démolition des toitures des bâtiments en rez-de-chaussée afin de les élever d'un étage et de créer des classes supplémentaires. Des travaux d'aménagement des locaux existants sont également prévus.

Cachet de l'opérateur


ALCYON
 58, avenue Labé - ZA les Paluds 2
 CS 51484
 13785 AUBAGNE CEDEX
 Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
 Siren 419 035 381
 Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr



Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 27/04/2015
par : GARREAU Yvane

à : AUBAGNE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné GARREAU Yvane, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 265707

Nous, EBA INSURANCESERVICESLTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est B11771400425, certifions que notre client :

ALCYON
58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n°B117700425/265707

VALIDITÉ

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION SE TEND DU 01/04/2015 AU 31/03/2016.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
B117700425/265707 (n° mandat B11771400425)	RESPONSABILITE CIVILE DE DROIT COMMUN	Assureur : Lloyd's 100% (numéros et pourcentages des syndicats : 50% syndicat Channel 2015, 50% syndicat CV Starr 1919) One Lime Street, London EC3M 7HA Royaume-Uni

CHAQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES
5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT
t: +44(0)20 7929 7711 f: +44(0)20 7929 7733 e: eba@eba-london.co.uk w: ebainsurance.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Page 1 de 3

Document émis le 02 Avril 2015

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

ACTIVITÉS GARANTIES

- Maitrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb
- Assistant à Maitrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation à l'exclusion de toute activité de maitrise d'œuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois
- Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contrôle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de performance énergétique, Diagnostic légionellose, Etat de l'installation intérieure de l'électricité, Millièmes
- Missions normées de contrôle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
- Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantèlement.
- Expert judiciaire
- Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de l'Article 8.1.18 EXCLUSION SET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré concernant l'Amiante

A dérogation de l'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse, ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES

5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT

t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

LES ASSUREURS NE COUVRENT EN AUCUN CAS LES CONSEQUENCES D'UN ABANDON DE CHANTIER.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2016, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à Londres, le 02/04/2015
Pour servir et faire valoir ce que de droit.



EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies
d'Assurance

EBA INSURANCE SERVICES
5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 3190 Version01

Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'I.Cert,
atteste que :

Madame Yvane GARREAU

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

<i>Amiante</i>	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 24/10/2014, date d'expiration : 23/10/2019
<i>Plomb</i>	Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/10/2014, date d'expiration : 23/10/2019

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire
Le 24/10/2014





Certification de personnes
Diagnostic
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA Bât G
Rue de la Terre Victoria
35760 Saint Grégoire
CPE DI FR 11 rev 09

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 02/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011



ACCREDITATION
N° 4-05-22
CERTIFICATION
DE PERSONNES
BOITEE D'INSTRUMENTATION
WWW.COFRAC.FR

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Procès-Verbaux du laboratoire d'analyses :

30 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18073 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60984 - Colle de carrelage - RDC classe n°2	Echantillon	IT041504-18073
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle blanchâtre compact hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanchâtre compact hétérogène	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18074 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analyse à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60985 - Colle de plinthe - RDC classe n°2	Echantillon	IT041504-18074
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle blanchâtre compacte avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanchâtre compacte avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18075 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60986 - Enduit mural - RDC classe n°2	Echantillon	IT041504-18075
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec papier et peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux en vrac avec papier et peinture inséparable	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18076 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analyisé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60987 - Faux-plafond 1 - RDC classe n°2	Echantillon	IT041504-18076
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Faux plafond jaunâtre fibreux homogène avec traces blanches inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond jaunâtre fibreux homogène avec traces blanches inséparables	MOLP le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18077 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60988 - Colle de carrelage - Réfectoire	Echantillon	IT041504-18077
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle grise compacte avec poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle grise compacte avec poussières inséparables	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18078 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60989 - Colle de plinthe - Réfectoire	Echantillon	IT041504-18078
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle blanche compacte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche compacte	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18079 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60990 - Enduit mural - Réfectoire	Echantillon	IT041504-18079
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18080 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60991 - Sol - Escalier accès appartement de fonction conciergerie	Echantillon	IT041504-18080
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Matériau gris compact avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18081 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60992 - Mur - Escalier accès appartement de fonction conciergerie	Echantillon	IT041504-18081
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Matériau gris compact avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des
poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau gris compact avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18082 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60993 - Enduit mural - Façade extérieur côté réfectoire	Echantillon	IT041504-18082
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit gris compact avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris compact avec peinture inséparable	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18083 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60994 - Enduit mural - Façade extérieur côté réfectoire	Echantillon	IT041504-18083
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit gris compact avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris compact avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18084 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE
Echantillon	60995 - Plaque sous tuile - Toiture côté concièrgerie
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-9209
Echantillon	IT041504-18084
Description ITGA	Plaque fibrociment grise compacte avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Plaque fibrociment grise compacte avec fibres visibles	MOLP le 14/05/2015	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18085 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60996 - Couverture ondulée - Toiture côté salle d'activités	Echantillon	IT041504-18085
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Couche bitumineuse souple avec couche rouge inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple avec couche rouge inséparable	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18086 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analyse à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE
Echantillon	60997 - Dalle de sol blanche - Sanitaires R+1
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-9209
Echantillon	IT041504-18086
Description ITGA	Dalle dure blanchâtre cassante compacte avec peinture inséparable

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Dalle dure blanchâtre cassante compacte avec peinture inséparable	META le 14/05/2015	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	3

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18087 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE
Echantillon	60998 - Colle noire sous dalle de sol blanche - Sanitaires R+1
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-9209
Echantillon	IT041504-18087
Description ITGA	Colle bitumineuse noire avec matériaux gris et blanchâtre en vrac inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle bitumineuse noire avec matériaux gris et blanchâtre en vrac inséparables	MOLP le 15/05/2015	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18088 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	60999 - Ragréage sous dalle de sol blanche - Sanitaires R+1	Echantillon	IT041504-18088
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Ragréage gris en vrac avec poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Ragréage gris en vrac avec poussières inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5870
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18089 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61000 - Enduit mural - Sanitaires R+1	Echantillon	IT041504-18089
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduits gris et blanchâtre plâtreux avec peintures Inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduits gris et blanchâtre plâtreux avec peintures Inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18090 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61001 - Faux plafond 3 - Sanitaires R+1	Echantillon	IT041504-18090
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 14/05/2015	Amiante non détecté Analyse confirmée au M.E.T	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18091 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61002 - Enduit mural - Classe n°3	Echantillon	IT041504-18091
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduits gris et blanc en vrac avec toile fibreuse blanche et peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduits gris et blanc en vrac avec toile fibreuse blanche et peintures inséparables	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18092 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61003 - Linoléum - Salle d'activités	Echantillon	IT041504-18092
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Revêtement souple gris avec poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris avec poussières inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18093 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61004 - Enduit mural - Salle d'activités	Echantillon	IT041504-18093
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit blanchâtre compact avec peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre compact avec peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18094 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61005 - Faux plafond 2 - Salle d'activités	Echantillon	IT041504-18094
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Faux plafond jaunâtre fibreux homogène avec traces blanches inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond jaunâtre fibreux homogène avec traces blanches inséparables	MOLP le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18095 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61006 - Colle sous carrelage grando beige - Terrasse conciergerie	Echantillon	IT041504-18095
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle carrelage beige avec carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle carrelage beige avec carrelage	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18096 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61007 - Crépi - Terrasse conciergerie	Echantillon	IT041504-18096
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Matériaux gris et blanchâtre compact avec peinture + poussières inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériaux gris et blanchâtre compact avec peinture + poussières inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18097 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE
Echantillon	61008 - Enduit mural - Façade conciergerie
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-9209
Echantillon	IT041504-18097
Description ITGA	Enduit gris compact avec peintures et traces de matériau beige Inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit gris compact avec peintures et traces de matériau beige inséparables	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18098 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61009 - Enduit mural - Façade côté salle de classe n°1 R+1	Echantillon	IT041504-18098
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit beige compact

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit beige compact	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18099 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61010 - Chappe maigre sous tomettes (sous dalle de sol blanche) - Sanitaires R+1	Echantillon	IT041504-18099
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Matériau rose en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau rose en vrac	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18100 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61011 - Colle de faïence - Sanitaires R+1	Echantillon	IT041504-18100
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle blanchâtre compacte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanchâtre compacte	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18101 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61012 - Enduit mural - Annexe classe n°2	Echantillon	IT041504-18101
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Enduit blanchâtre avec toile fibreuse blanche et peintures inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre avec toile fibreuse blanche et peintures inséparables	META le 14/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02.90.09.39.20
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041504-18102 EN DATE DU 15/05/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

Société ALCYON
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 28/04/2015
Analysé à : ITGA Saint-Grégoire K

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1796 20150400295 VDM ECOLE MATERNELLE SAINTE MARGUERITE	Commande	IT0415-9209
Echantillon	61013 - Colle de faïence - Annexe classe n°2	Echantillon	IT041504-18102
Dossier client	Ecole maternelle Sainte Marguerite VDM	Description ITGA	Colle blanche en vrac avec peintures et fibres Inséparables

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche en vrac avec peintures et fibres Inséparables	META le 13/05/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Nolwenn MIGAUD - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 364 rev 09
