



58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2
CS 51484
13785 AUBAGNE

Tél. : 04 42 04 99 81
Fax : 04 42 04 99 27
Email : contact@alcyon.pro

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

RAPPORT DE REPERAGE **20150700727_EM SAINTE MARGUERITE-LOGT CONCIERGE / AMIANTE**
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE **04/08/2015**

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission :

Adresse :	Ecole Maternelle Sainte Marguerite 10, Boulevard Pagès 13009 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Logement concierge
Date de visite :	20/07/2015

GARREAU Yvane

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	3
2.	Conclusions du rapport	6
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	9
4.	Résultats détaillés du repérage	11
5.	Attestation sur l'honneur.....	13
6.	Attestation d'assurance.....	14
7.	Certificat de compétences	17
8.	Annexes.....	18

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Bâtiment
Numéro (indice) : 20150700727_EM Sainte Marguerite-logt concierge
Date du permis de construire
(à défaut date de Non communiqué
construction) :
Adresse complète : Ecole Maternelle Sainte Marguerite
10, Boulevard Pagès
13009 MARSEILLE
Référence cadastrale : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété
Fonction principale du bâtiment : ERP de type R

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : Ville de Marseille
Adresse : DIRCA / Service Territorial des Bâtiments Est
13009 MARSEILLE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : GARREAU Yvane
Email : contact@alcyon.pro
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I Cert . Le N° du certificat est N° CPDI 3190 délivré le 24/10/2014 et expirant le 23/10/2019.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : ALCYON
Adresse : 58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2
CS 51484 - 13785 AUBAGNE
Numéro SIRET : 419 035 381 00047
Code NAF : 7112B
N° TVA : FR 26 419 035 381
N° RCS : Marseille 2001 B 01199
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : LLOYD'S
N° de police : B117700425/265707
Valide jusqu'au : 31/03/2016

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arteparc
Bâtiment E - Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

- ***Nature et périmètre des travaux envisagés :***

Le diagnostic est limité aux éléments impactés par les travaux de réfection du logement concierge, désignés par le donneur d'ordre le jour de notre visite.

- ***Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :***

Néant

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

Remarques particulières :
Néant

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement	Etat
Néant			

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat
Néant			

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Après analyse en laboratoire :

Description	Localisation	Prélèvement
Faux plafond/Plaque	Cuisine	n° 61397
Revêtement de sol/Colle de carrelage [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 61398
Revêtement de mur/Colle de faïence [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 60399
Revêtement de mur/Colle de plinthes [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 61401
Mur/Enduit projeté	Cuisine	n° 61400
Plaque sonore sous évier/Plaque noire bitumineuse [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 61402
Plaque sonore sous évier/Plaque noire bitumineuse [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 61403
Plafond/Enduit projeté	Cuisine	Voir fiche n°61407
Revêtement de mur/Colle noire sous plinthes plastique [Hors annexe 13-9]	Cuisine	n° 61410
Mur/Enduit projeté (et toile de verre)	Séjour	n° 61406
Revêtement de sol/Lés plastique avec sous-couche	Séjour	n° 61408
Plafond/Enduit projeté	Séjour	Voir fiche n°61407
Revêtement de sol/Ravaillage sous tomettes [Hors annexe 13-9]	Séjour	n° 61409
Revêtement de mur/Colle de faïence [Hors annexe 13-9]	WC et Salle de bains	n° 61404
Faux plafond/Plaque	WC et Salle de bains	n° 61405
Plafond/Enduit projeté	WC et Salle de bains	n° 61407

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	

2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées


Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2.4 Plans de localisation des MPCA

Sont précisées sur le croquis la localisation des prélèvements

Logement concierge de l'école maternelle Sainte Marguerite

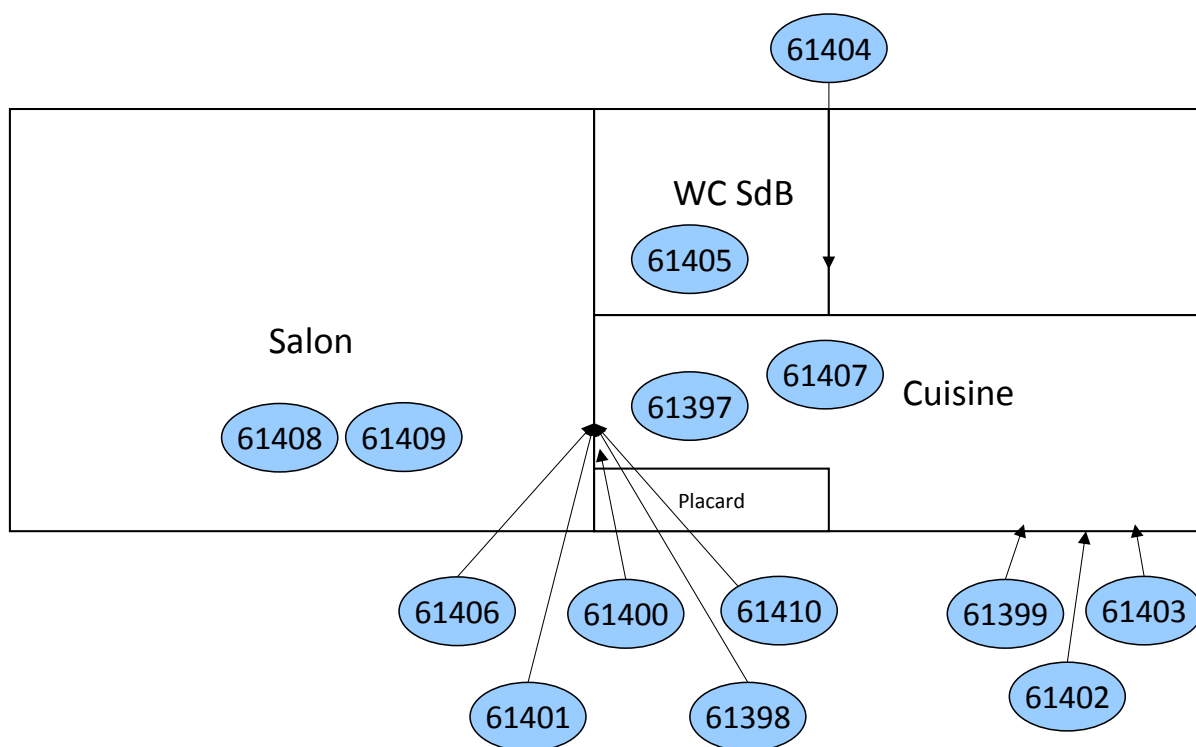

Légende:



Echantillon : absence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 20/07/2015
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Ville de Marseille (M. Hervé Palumbo)

3.1 Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom
Cuisine
Séjour
WC et Salle de bains

3.2 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Néant	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.3 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage


Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/absence d'amiante	Etat
Cuisine	Faux plafond	Plaque		-	Oui : 61397	Absence d'amiante	
Cuisine	Revêtement de sol	Colle de carrelage		-	Oui : 61398	Absence d'amiante	
Cuisine	Revêtement de mur	Colle de faïence		-	Oui : 60399	Absence d'amiante	
Cuisine	Revêtement de mur	Colle de plinthes		-	Oui : 61401	Absence d'amiante	
Cuisine	Mur	Enduit projeté		-	Oui : 61400	Absence d'amiante	
Cuisine	Plaque sonore sous évier	Plaque noire bitumineuse		-	Oui : 61402	Absence d'amiante	
Cuisine	Plaque sonore sous évier	Plaque noire bitumineuse		-	Oui : 61403	Absence d'amiante	
Cuisine	Plafond	Enduit projeté		-	Voir fiche n°61407	Absence d'amiante	
Cuisine	Revêtement de mur	Colle noire sous plinthes plastique		-	Oui : 61410	Absence d'amiante	
Séjour	Mur	Enduit projeté	et toile de verre	-	Oui : 61406	Absence d'amiante	
Séjour	Revêtement de sol	Lés plastique avec sous-couche		-	Oui : 61408	Absence d'amiante	
Séjour	Plafond	Enduit projeté		-	Voir fiche n°61407	Absence d'amiante	
Séjour	Revêtement de sol	Ravoirage sous tomettes		-	Oui : 61409	Absence d'amiante	
WC et Salle de bains	Revêtement de mur	Colle de faïence		-	Oui : 61404	Absence d'amiante	
WC et Salle de bains	Faux plafond	Plaque		-	Oui : 61405	Absence d'amiante	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amianté avant travaux

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Conclusion	
						Présence/absence d'amianté	Etat
WC et Salle de bains	Plafond	Enduit projeté		-	Oui : 61407	Absence d'amianté	

Observations : Le diagnostic est limité aux éléments impactés par les travaux de réfection du logement concierge, désignés par le donneur d'ordre le jour de notre visite.

Cachet de l'opérateur


ALCYON
 58, avenue Labé - ZA les Paluds 2
 CS 51484
ALCYON 13785 AUBAGNE CEDEX
 Tél. 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27
 Siren 419 035 381
 Mail : alcyon_marseille@yahoo.fr



Date de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le : 20/07/2015
 par : GARREAU Yvane

Rapport édité le : 04/08/2015

à : AUBAGNE

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné GARREAU Yvane, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

Référence: 265707

Nous, EBA INSURANCESERVICESLTD, agissant sous forme d'une délégation de souscription dont le numéro d'agrément est B11771400425, certifions que notre client :

ALCYON
58 Avenue Labé
ZA Les Paluds 2
13400 Aubagne

Est titulaire par notre intermédiaire d'un contrat de Responsabilité Civile Professionnelle et d'Exploitation sous le n°B117700425/265707

VALIDITÉ

LA PERIODE DE VALIDITE DE LA PRESENTE ATTESTATION SE TEND DU 01/04/2015 AU 31/03/2016.

DESIGNATION DES ASSUREURS

Numéro de contrat	Garantie	Désignation et adresse des Assureurs
B117700425/265707 (n° mandat B11771400425)	RESPONSABILITE CIVILE DE DROIT COMMUN	Assureur : Lloyd's 100% (numéros et pourcentages des syndicats : 50% syndicat Channel 2015, 50% syndicat CV Starr 1919) One Lime Street, London EC3M 7HA Royaume-Uni

CHAQUE SYNDICAT S'ENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ET NON L'UN POUR L'AUTRE, SANS SOLIDARITE ENTRE EUX.

EBA INSURANCE SERVICES
5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT
t: +44(0)20 7929 7711 f: +44(0)20 7929 7733 e: eba@eba-london.co.uk w: ebainuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

ACTIVITÉS GARANTIES

- Maitrise d'Oeuvre de désamiantage, démolition et retrait peinture plomb
- Assistant à Maitrise d'ouvrage (programmation, évaluation & budgétisation à l'exclusion de toute activité de maitrise d'œuvre) de désamiantage, démolition, retrait peinture plomb et pathologie des bois
- Expert diagnostic pour les expertises suivantes : Contrôle Périodique amiante, Diagnostic amiante avant travaux et avant démolition, Diagnostic amiante avant-vente, Dossier technique amiante, Diagnostic gaz, Diagnostic termites, Etat parasitaire, Exposition au plomb (CREP), Recherche de plomb avant travaux et avant démolition, Loi Carrez, diagnostic de performance énergétique, Diagnostic légionellose, Etat de l'installation intérieure de l'électricité, Millièmes
- Missions normées de contrôle de chantiers de désamiantage, et décontamination de peintures au plomb
- Expert diagnostic sur les équipements industriels uniquement dans le cadre de diagnostics avant démantèlement.
- Expert judiciaire
- Audit sans préconisation & Formation

CONDITIONS SPECIALES

A dérogation de l'Article 8.1.18 EXCLUSION SET DECHEANCE des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré concernant l'Amiante

A dérogation de l'Article 3.2. OUVRAGES GARANTIS des conditions générales, il est entendu que les garanties du présent contrat s'étendent aux missions et interventions de l'Assuré sur ouvrages de type: portes d'écluse, ponts levants, ouvrage de stockage d'eau, barrages, retenues & ouvrages de prise et rejet d'eau

EBA INSURANCE SERVICES

5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT

t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

OBSERVATIONS

Ces contrats d'assurance seront soumis aux lois de la République Française.

Les missions sont garanties en France et Dom-Toms.

Cette attestation est délivrée :

- pour des opérations de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN) ou à des règles professionnelles acceptées par la C2P,
- pour des procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - d'un Agrément Technique Européen (ATE) bénéficiant d'un Document Technique d'Application (DTA), ou d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en observation par la C2P,
 - d'une Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX) avec avis favorable,
 - d'un Pass'innovation « vert » en cours de validité.

LES ASSUREURS NE COUVRENT EN AUCUN CAS LES CONSEQUENCES D'UN ABANDON DE CHANTIER.

La présente attestation est valable jusqu'au 31/03/2016, et ne peut engager l'assureur en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat (remises à l'assuré) auxquelles elle se réfère. Elle ne constitue qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

L'attestation est valable sous réserve des dispositions de l'article L113-3 du code des assurances régissant le paiement de la cotisation.

Fait à Londres, le 02/04/2015
Pour servir et faire valoir ce que de droit.



EBA INSURANCE SERVICES LTD,
en sa qualité de mandataire de certains
Souscripteurs du Lloyd's et de Compagnies
d'Assurance

EBA INSURANCE SERVICES
5-10 Bury Street, 5th Floor, LONDON, EC3A 5AT
t:+44(0)20 7929 7711 f:+44(0)20 7929 7733 e:eba@eba-london.co.uk w:ebainsuranceservices.com

Lloyd's Broker - 1177: Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority: Company Registration no. 3609556

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



CERTIFICAT DE COMPETENCES DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER

N° CPDI 3190 Version01

Je soussigné
Philippe TROYAUX,
Directeur Général d'I.Cert,
atteste que :

Madame Yvane GARREAU

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de certification de personnes I.Cert pour la réalisation des missions suivantes :

<i>Amiante</i>	Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis Date d'effet : 24/10/2014, date d'expiration : 23/10/2019
<i>Plomb</i>	Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 24/10/2014, date d'expiration : 23/10/2019

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Saint-Grégoire
Le 24/10/2014





Certification de personnes
Diagnostic
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc EDONIA Bât G
Rue de la Terre Victoria
35760 Saint-Grégoire
CPE DI FR 11 rev 09

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 02/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation modifié par l'arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité modifié par les arrêtés du 10/12/2009 et du 02/12/2011.



ACCREDITATION
N° 44922
CERTIFICATION
DE PERSONNES
PORTÉE D'ISOINTELEUR
WWW.COFRAC.FR

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Sommaire des annexes

Procès-Verbaux du laboratoire d'analyses du laboratoire :

14 pages

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8706 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61400 - Enduit murale et colle de plinthe - Cuisine	Echantillon	IT041507-8706
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8714 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61408 - Linoléum au dessus des tomettes - Salon	Echantillon	IT041507-8714
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Revêtement souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Revêtement souple gris	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8704 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyse à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61398 - Colle de carrelage - Cuisine
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8704
Description ITGA	Colle blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8712 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61406 - Enduit murale et toile de verre - Salon
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8712
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et toile fibreuse blanche peinte

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture et toile fibreuse blanche peinte	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8705 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyisé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61399 - Colle de faïence - Cuisine	Echantillon	IT041507-8705
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Colle blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8713 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyisé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61407 - Enduit plafond - Cuisine, sdb, salon
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt- Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8713
Description ITGA	Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Enduit blanchâtre plâtreux avec peinture	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8707 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyisé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61401 - Colle de plinthe - Cuisine
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8707
Description ITGA	Colle blanche et grise avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche et grise avec peinture	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8715 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61409 - Colle sous tomettes terre cuite - Salon	Echantillon	IT041507-8715
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Matériau rose et gris compact

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau rose et gris compact	META le 25/07/2015	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8703 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61397 - Faux plafond - Cuisine	Echantillon	IT041507-8703
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Faux plafond beige fibreux homogène avec fibres visibles et peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond beige fibreux homogène avec fibres visibles et peinture blanche	MOLP le 23/07/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8711 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61405 - Faux plafond - SDB
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8711
Description ITGA	Faux plafond grisâtre fibreux homogène avec peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Faux plafond grisâtre fibreux homogène avec peinture blanche	MOLP le 23/07/2015	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8708 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61402 - Plaque noire sous évier 2 (aspect fibreux) - Cuisine	Echantillon	IT041507-8708
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 23/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8716 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyse à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Réf. ITGA :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE	Commande	IT0415-15545
Echantillon	61410 - Mastic noir sous plinthe - Cuisine	Echantillon	IT041507-8716
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge	Description ITGA	Matériau blanc en vrac avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Matériau blanc en vrac avec peinture	META le 24/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portée
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8709 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analysé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61403 - Plaque noire sous évier 1 (rainurée) - Cuisine
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8709
Description ITGA	Couche bitumineuse souple

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Couche bitumineuse souple	META le 23/07/2015	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041507-8710 EN DATE DU 27/07/2015 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai comporte 1 page, il ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

ALCYON SARL
Mme Yvane GARREAU
58, rue Labbé
13400 AUBAGNE

Prélèvement :

Reçu au laboratoire le : 20/07/2015
Analyisé à : ITGA Meyreuil

Réf. Client :

Commande	1986- EM STE MARGUERITE
Echantillon	61404 - Colle de faïence - SDB
Dossier client	EM Ste Marguerite Logt Concierge

Réf. ITGA :

Commande	IT0415-15545
Echantillon	IT041507-8710
Description ITGA	Colle blanche avec peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération des poussières sur grille de microscope électronique

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de Prépas
Colle blanche avec peinture	META le 27/07/2015	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR024

DTA 164 rev 09
